

云南艺术学院二期建设工程周报

(2023年10月27日)

一、二期建设工程当前形象进度

1. 艺术实践中心(1#2#3#教学楼), 剧场音乐厅综合楼(1#2#教学楼), 剧场音乐厅综合楼1#教学楼1-6/1-15轴交1-A/1-D轴18.000m模板安装完成, 1-5/1-6轴、1-15/1-15轴交1-H/1-L轴17.100-19.500m梁板模板安装, 1-2/1-16轴交1-L/1-M轴、2-2/2-8轴交2-G/2-K轴18.600m模板安装完成80%; 2#教学楼2-9/2-16轴交2-A/2-K轴18.600m模板安装完成50%; 美术实训用房(3#教学楼)实训用房地下室及二层砖砌体砌筑完成50%, 地下室圈梁以下构造柱浇筑完成, 一层圈梁以下构造柱浇筑完成50%; 电影院、服务中心±0.000m垫层混凝土浇筑完成, 办公区4.500m层梁钢筋安装完成; 2#、3#教学楼之间服务中心3.900m梁板模板安装完成。5#教学楼A区、B区三层内墙抹灰完成, 四层内墙抹灰完成60%, B区外墙抹灰完成; C区外墙抗裂砂浆施工, 内墙抹灰除楼梯间及走到外其余部分施工完成。6#教学楼A区五层砌筑完成, 四层构造柱浇筑完成, 一层抹灰完成70%, 屋面防水第一道防水施工完成, 蓄水实验完成; B区五层砌筑完成, 四层构造柱混凝土浇筑完成, 一层抹灰完成50%; C区一层砖砌体砌筑完成80%; 室外台阶平台混凝土浇筑完成。



剧场音乐厅（1#2#教学楼）

1#教学楼18.000m、17.100-19.500m、18.600m梁板模板安装

2#教学楼18.600m梁板模板安装



美术实训用房（3#教学楼）

电影院、服务中心回±0.000m垫层浇筑，

2#、3#教学楼之间服务中心3.900m梁板模板安装



美术实训用房（3#教学楼）

办公区一层顶板模板安装、梁钢筋绑扎

5#教学楼

B区外墙抹灰



5#教学楼

A区内墙拉毛

6#教学楼

A区一层内墙抹灰



6#教学楼

A区五层构造柱末班安装

B区五层砌筑

2. 由于由于施工方自身原因，本周体育馆及7#教学楼施工人员不足，现场有改观但建设工程进度仍滞后。体育馆T-1区一层模板施工完成；T-2区一层钢筋绑扎完成；T-3区一层混凝土浇筑完成。4#教学楼内墙抹灰收尾完成，外墙抹灰收尾完成，4-2区外架拆除完成；天棚第一遍本周刮白完成30%，累计完成90%；水磨石样板完成，水磨石找平层完成30%；吊顶样板完成；钢结构女儿墙浇筑完成；屋面挤塑聚苯板完成，找平层浇筑完成；机电桥架安装完成，灯线及开关线穿线完成，雨落管安装完成，消防桥架样板完成；风管安装本周完成20%，累计完成80%。7#教学楼7-1区四层支模架完成，钢筋绑扎完成20%；7-2区支模架、钢筋绑扎完成；7-3区四层支模架完成40%；7-4西区二层钢筋绑扎完成；7-4东区三层支模架完成，钢筋绑扎完成20%；7-5西区一层浇筑完成；7-5东区三层浇筑完成。



体育馆T-1区一层模板施工完成

体育馆T-2区一层钢筋绑扎完成



体育馆 T-3混凝土浇筑完成



4#教学楼 外墙抹灰收尾




天棚第一遍腻子刮白本周完成30%



水磨石样板完成

4#教学楼

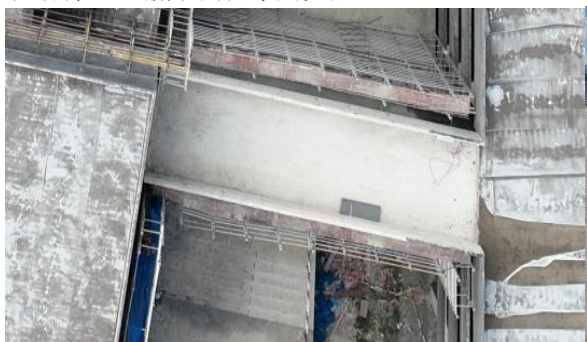

钢连廊女儿墙浇筑完成



屋面找平层完成

4#教学楼



桥架及穿线安装完成



风管本周完成20%

4#教学楼



7#教学楼

7-1区四层钢筋绑扎完成20%

7-2区四层钢筋绑扎完成



7#教学楼

7-3区四层内膜支架完成40%

7-4西区二层梁筋绑扎完成



7#教学楼

7-4东区三层钢筋绑扎完成20%

7-5西区一层浇筑完成



7#教学楼7-5区东区一层浇筑完成

二、工程建设组严格把控工程质量，重视现场安全文明施工，推进工程进度，配合职能部门现场检查及建筑协会专家现场指导创优工艺

1. 质量方面：首先严格把关原材进场及现场取样真实性，如发现不符合要求材料或是下料尺寸不满足要求的部分一律撤出场地；确保关键工序的施工质量，加强现场巡检，参与分部分项验收，落实现场质量问题的整改情况，确保现场工程质量。

2. 安全方面：坚持安全无小事的原则，坚持开展安全大排查并进行问题汇总入库。

3. 进度方面：为保证现场工程进度，组织图纸二次深化设计现场答疑会及地砖现场初步认样；针对中建七局现场进度滞后问题，现场多次与监理、施工单位开展座谈。

4. 配合呈贡区质量安全监督管理站进行现场检查及建筑协会专家创优工作现场指导。



抽检现场混凝土试块及坍落度检测




夜间浇筑巡检



现场水磨石样板验收



每周安全检查

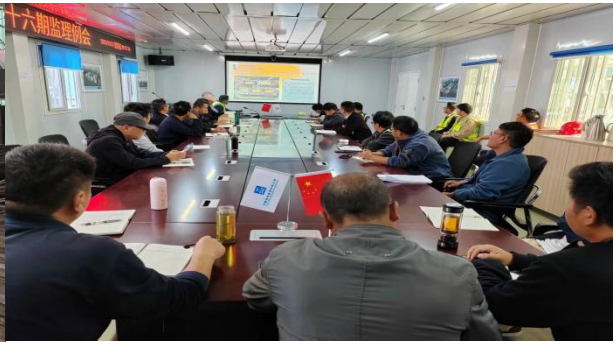

每周监理例会



图纸二次深化设计现场答疑



地砖现场初步认样



现场进度推进座谈



呈贡区质量安全监督站现场检查



建筑协会专家创优工作现场指导
