

云南艺术学院二期建设工程周报

(2023 年 12 月 29 日)

一、二期建设工程当前形象进度

1. 艺术实践中心（1#2#3#教学楼），剧场音乐厅综合楼（1#2#教学楼）地下室至四层砖砌体及构造柱施工完成，五层、六层砖砌体砌筑完成80%；BRB安装完成80%，通风立管安装完成80%，地下室通风风管水平安装40%，楼梯间管内穿线90%，二次结构墙体配管完成60%。美术实训用房（3#教学楼）内外墙抹灰完成，电影院内、服务中心第一道防水施工完成；消火栓箱安装完成90%，消防管道安装70%，楼梯间管内穿线完成60%，通风管道安装20%。5#教学楼水磨石石子铺装完成70%，A区、B区外墙真石漆完成50%，C区、D区真石漆施工完成40%，种植屋面花池挡墙砌筑完成50%，一层防水施工完成40%；卫生间排水管道安装80%。6#教学楼A区五层第二道内墙腻子完成，外墙第一道真石漆抗裂砂浆完成，外墙第二道真石漆抗裂砂浆完成30%，水磨石地面找平层施工完成80%，水磨石面层碎石施工完成30%。B区四层、五层内墙第一道腻子完成，外墙第一道真石漆抗裂砂浆完成，水磨石地面找平层施工完成90%，水磨石面层碎石施工完成60%；C区二层内墙抹灰完成90%；外墙第一道真石漆抗裂砂浆完成50%，C区屋面第三道防水完成20%；C区桥架安装30%，C区管内穿线50%，A区水平防排烟风管安装20%。



剧场音乐厅（1#2#教学楼）

1#教学楼砖砌体砌筑

2#教学楼一层抹灰施工



实训用房风管安装



实训用房外墙抹灰施工

美术实训用房（3#教学楼）



A区、B区三层水磨石施工




C区外墙真石漆分缝

5#教学楼



A区屋面第二道防水施工



水磨石铝条安装

6#教学楼

2. 体育馆-1区东侧5.95-11.95m二层主体结构浇筑完成，T-3区5.95-14.565m二层看台浇筑完成；T-1区、T-2区、T-3区5.95m-12m框架柱、框架梁主体结构浇筑完成；T-1区、T-2区、T-3区12m-13m框架柱、框架梁主体结构浇筑完成。T-2区、T-3区5.95m-20.5m三层支架搭设完成95%，底模完成80%。4#教学楼4-1区、4-2区、4-3区屋面切缝完成，填油膏完成80%；女儿墙抹灰完成；4-4区屋面第一遍防水完成，排水沟砌筑完成；4-1区、4-2区、4-3区水磨石完成（除楼梯及平台未施工）；天棚第二遍腻子刮白完成，弱电

井刮白完成、弱电设备房刮白及涂料完成，走道天棚刮白完成40%；水电桥架完成，灯线、开关及插座线穿线完成，电箱安装完成，雨水管安装完成，卫生间洁具布管完成，给水安装打压完成；消防箱安装完成，消防桥架安装完成，消防管安装完成，打压完成，火灾报警器穿线完成，应急照明穿线完成，智能化穿线完成；钢连廊防水、找平层、水磨石浇筑完成；正式电梯安装完成（待调试验收）；阻尼器安装完成33个（共48个）；4-3区一层卫生间防水完成，蹲便安装完成（样板间）。7#教学楼主体结构完成；7-1、7-2、7-3区屋面天窗浇筑完成50%；7-4、7-5区屋面天窗支模及钢筋绑扎完成90%；楼层后浇带浇筑完成60%；7-1区、7-2区、7-3区一层、二层二构完成；三层二构砌体完成,在施构造柱；四层砌体完成60%；7-4区、7-5区一层砌体完成；二层砌体完成60%；钢结构构件进场、7-3与7-5区连廊吊装完成、7-4区连廊吊装准备中；7-1区一层二次配管、挂网甩浆完成，7-2、3区一层在施二次配管。



体育馆

T-1区13m-20.5m支模架完成50%

T-2区5.95m-20.5m支模架完成，底模铺筑完成80%



体育馆

4#教学楼

T-3区5.95m-20.5m支模架完成，底模铺筑完成80%

阻尼器安装



走道顶棚腻子刮白



静电地板安装

4#教学楼



屋面天窗施工



二次结构施工

7#教学楼



钢结构吊装



后浇带浇筑

7#教学楼

二、工程建设组严格把控工程质量，重视现场安全文明施工，加强纪律作风建设

1. 质量方面：严格把关原材料进场及现场取样真实性，如发现不符合要求材料或是下料尺寸不满足要求的部分一律撤出场地；为确保关键工序的施工质量，加强现场巡检，参与分部分项验收，落实现场质量问题的整改情况，分项工作严格要求样板先行，进场材料组织认质认样小组现场认样工作，确保现场工程质量，针对现场安装工程厂家进行考察。

2. 安全方面：坚持安全无小事的原则，坚持开展每周安全排查及元旦节前排查，并进行问题汇总入库。强调做好春节前工人安定工作，确保年前安全文明施工。


3. 把纪律作风建设贯穿项目建设始终，在监理例会上再次强调廉洁建设，要求参建各方严守纪律法规，杜绝歪风邪气，落实“阳光工程、廉洁工程”要求。



进场窗框抽检



现场砌筑质量检查

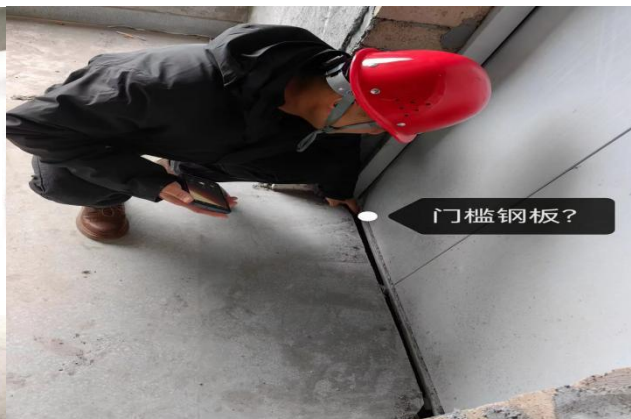

电梯安装检查



落实现场三检举牌验收制度



门框及窗框生产厂家考察



走道取消吊顶样板验收



落实砌筑不合格部位返工



组织认质认样小组现场认样



现场安全检查及问题入库



三、云南艺术学院副院长、二期建设指挥部指挥长王建才同志到施工现场检查指导

